Fremdriftsplan Utvidelse Eidfjord

REPSTAD ANLEGG AS

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser
1	**Utvidelse Eidfjord**	**149 dager**	**ma 06.10.25**	**to 30.04.26**		
2	**Kontrakt**	**1 dag**	**ma 06.10.25**	**ma 06.10.25**		
3	Tildeling og signering kontrakt	1 dag	ma 06.10.25	ma 06.10.25		
4	**Prosjektering og bygging**	**148 dager**	**ti 07.10.25**	**to 30.04.26**		
5	**Prosjektering og søknader**	**30 dager**	**ti 07.10.25**	**ma 17.11.25**		
6	Prosjektering	30 dager	ti 07.10.25	ma 17.11.25	3	
7	Oppstart byggeplass	1 dag	ti 17.11.25	ti 18.11.25	6	
8	**Bygging av kai**	**148 dager**	**ti 07.10.25**	**to 30.04.26**		
9	**Tilrigging**	**2 dager**	**on 17.11.25**	**to 20.11.25**	**7**	
10	Byggegjerde	1 dag	on 17.11.25	on 19.11.25		
11	Produksjonsområde	2 dager	on 17.11.25	to 20.11.25		
12	**Fundamentering i sjø**	**96 dager**	**ti 07.10.25**	**ti 17.02.26**		
13	Bestilling stålrør	40 dager	ti 07.10.25	ma 01.12.25	3	
14	Ramming stålrørspel med rekkeviddemaskin - 6 stk	9 dager	ti 02.12.25	fr 12.12.25	13	
15	Akse B1 - 2stk	3 dager	ma 15.12.25	on 17.12.25	14	
16	Akse B - 4stk	6 dager	to 18.12.25	to 25.12.25	15	
17	Akse A - 7stk	13 dager	fr 26.12.25	ti 13.01.26	16	
18	slakk sjøarbeid	20 dager	on 14.01.26	ti 10.02.26	17	
19	Nedrigg	5 dager	on 11.02.26	ti 17.02.26	18	
20	**Betongarbeider**	**104 dager**	**on 19.11.25**	**ma 13.04.26**		
21	Fundament land kai inkl graving	30 dager	on 19.11.25	ti 30.12.25	7	
22	Utstøping Peler	15 dager	on 11.02.26	ti 03.03.26	18	
23	Stedstøpte bjelker akse B1 og C1	35 dager	on 31.12.25	ti 17.02.26	21	
24	Stedstøpte bjelker Akse N1 - N7	60 dager	fr 26.12.25	to 19.03.26	16	
25	Montering frontskjørt og dekkeelement	15 dager	on 18.02.26	ti 10.03.26	23	
26	Armering og støp kai	18 dager	on 11.03.26	fr 03.04.26	25	
27	Montasje Horisontalt rør	6 dager	ma 06.04.26	ma 13.04.26	26	
28	**Kaiutstyr**	**34 dager**	**on 11.03.26**	**ma 27.04.26**		
29	Fendring	10 dager	ti 14.04.26	ma 27.04.26	27	
30	Leider	2 dager	ti 14.04.26	on 15.04.26	27	
31	Pullere	4 dager	on 11.03.26	ma 16.03.26	25	
32	Nedrigging	2 dager	ti 28.04.26	on 29.04.26	29	
33	Overlevering	1 dag	to 30.04.26	to 30.04.26	32	

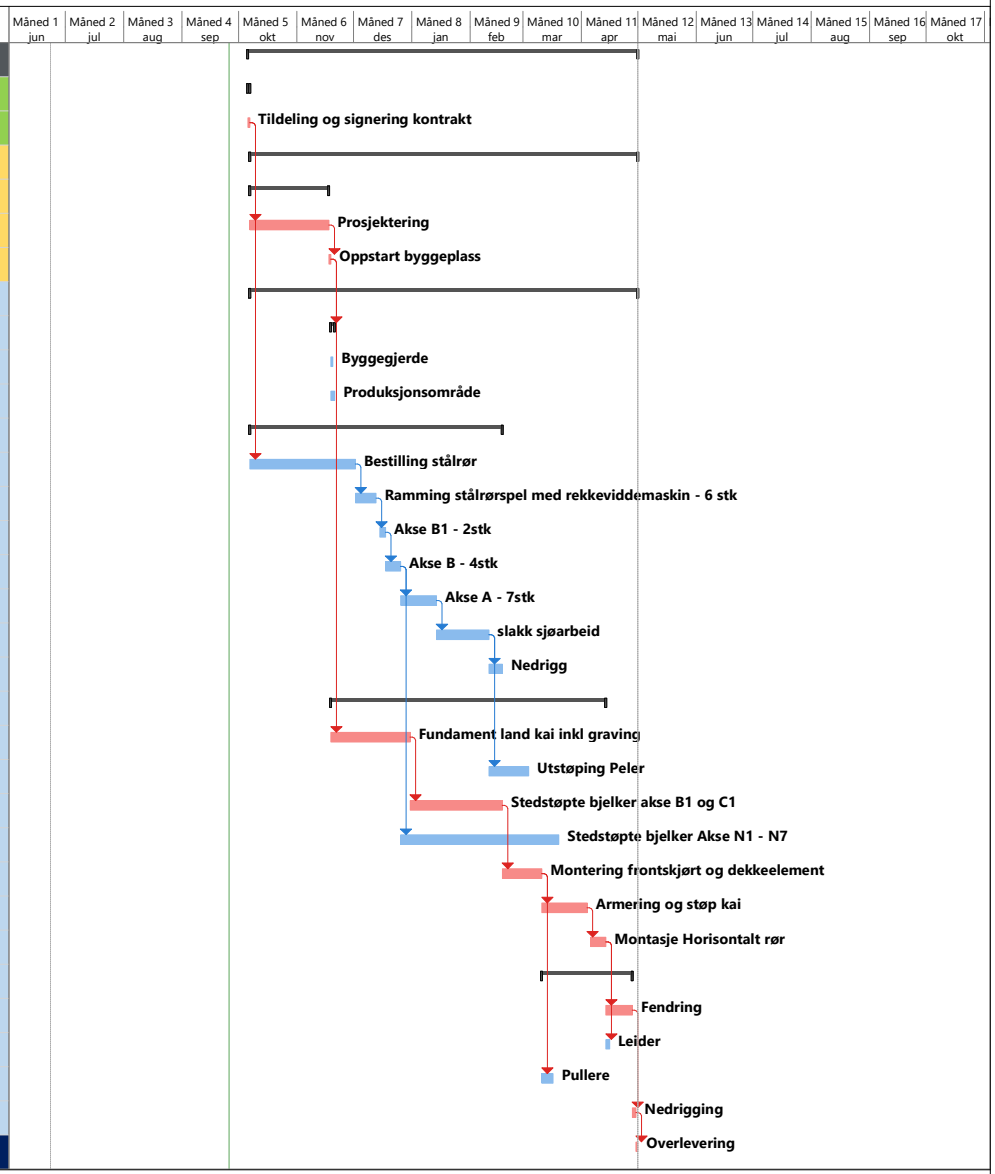

Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist		Manuell fremdrift
Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Kritisk		
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Kritisk deling		
Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl		Fremdrift		
